


COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN ROMÂNIA

SITUAȚIA PRINCIPALELOR SARCINI FIZICE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE LA PARTEA CAROSABILĂ PE ANUL 2017

| D.R.D.P | TIPUL LUCRARILOR DE INTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE | UM | PROGRAMAT 2017 | REALIZĂRI CUMULAT SEPTEMBRIE 2017 |
|-----------|--|----------|----------------|-----------------------------------|
| BUCUREȘTI | TOTAL lucrări la partea carosabilă | km echiv | 340 | 282 |
| CRAIOVA | TOTAL lucrări la partea carosabilă | km echiv | 261 | 255 |
| TIMISOARA | TOTAL lucrări la partea carosabilă | km echiv | 232 | 193 |
| CLUJ | TOTAL lucrări la partea carosabilă | km echiv | 206 | 181 |
| BRASOV | TOTAL lucrări la partea carosabilă | km echiv | 125 | 86 |
| IAȘI | TOTAL lucrări la partea carosabilă | km echiv | 303 | 301 |
| CONSTANTA | TOTAL lucrări la partea carosabilă | km echiv | 193 | 249 |

NOTĂ : Totalul lucrărilor la partea carosabilă este format din

- 1.PLOMBĂRI GROPI
- 2.REPARAȚII BURDUȘIRI
- 3.COLMATĂRI ROSTURI ȘI FISURI
- 4.TRATAMENTE BITUMINOASE
- 5.STRATURI RUTIERE FOARTE SUBȚIRI
- 6.COVOARE ASFALTICE

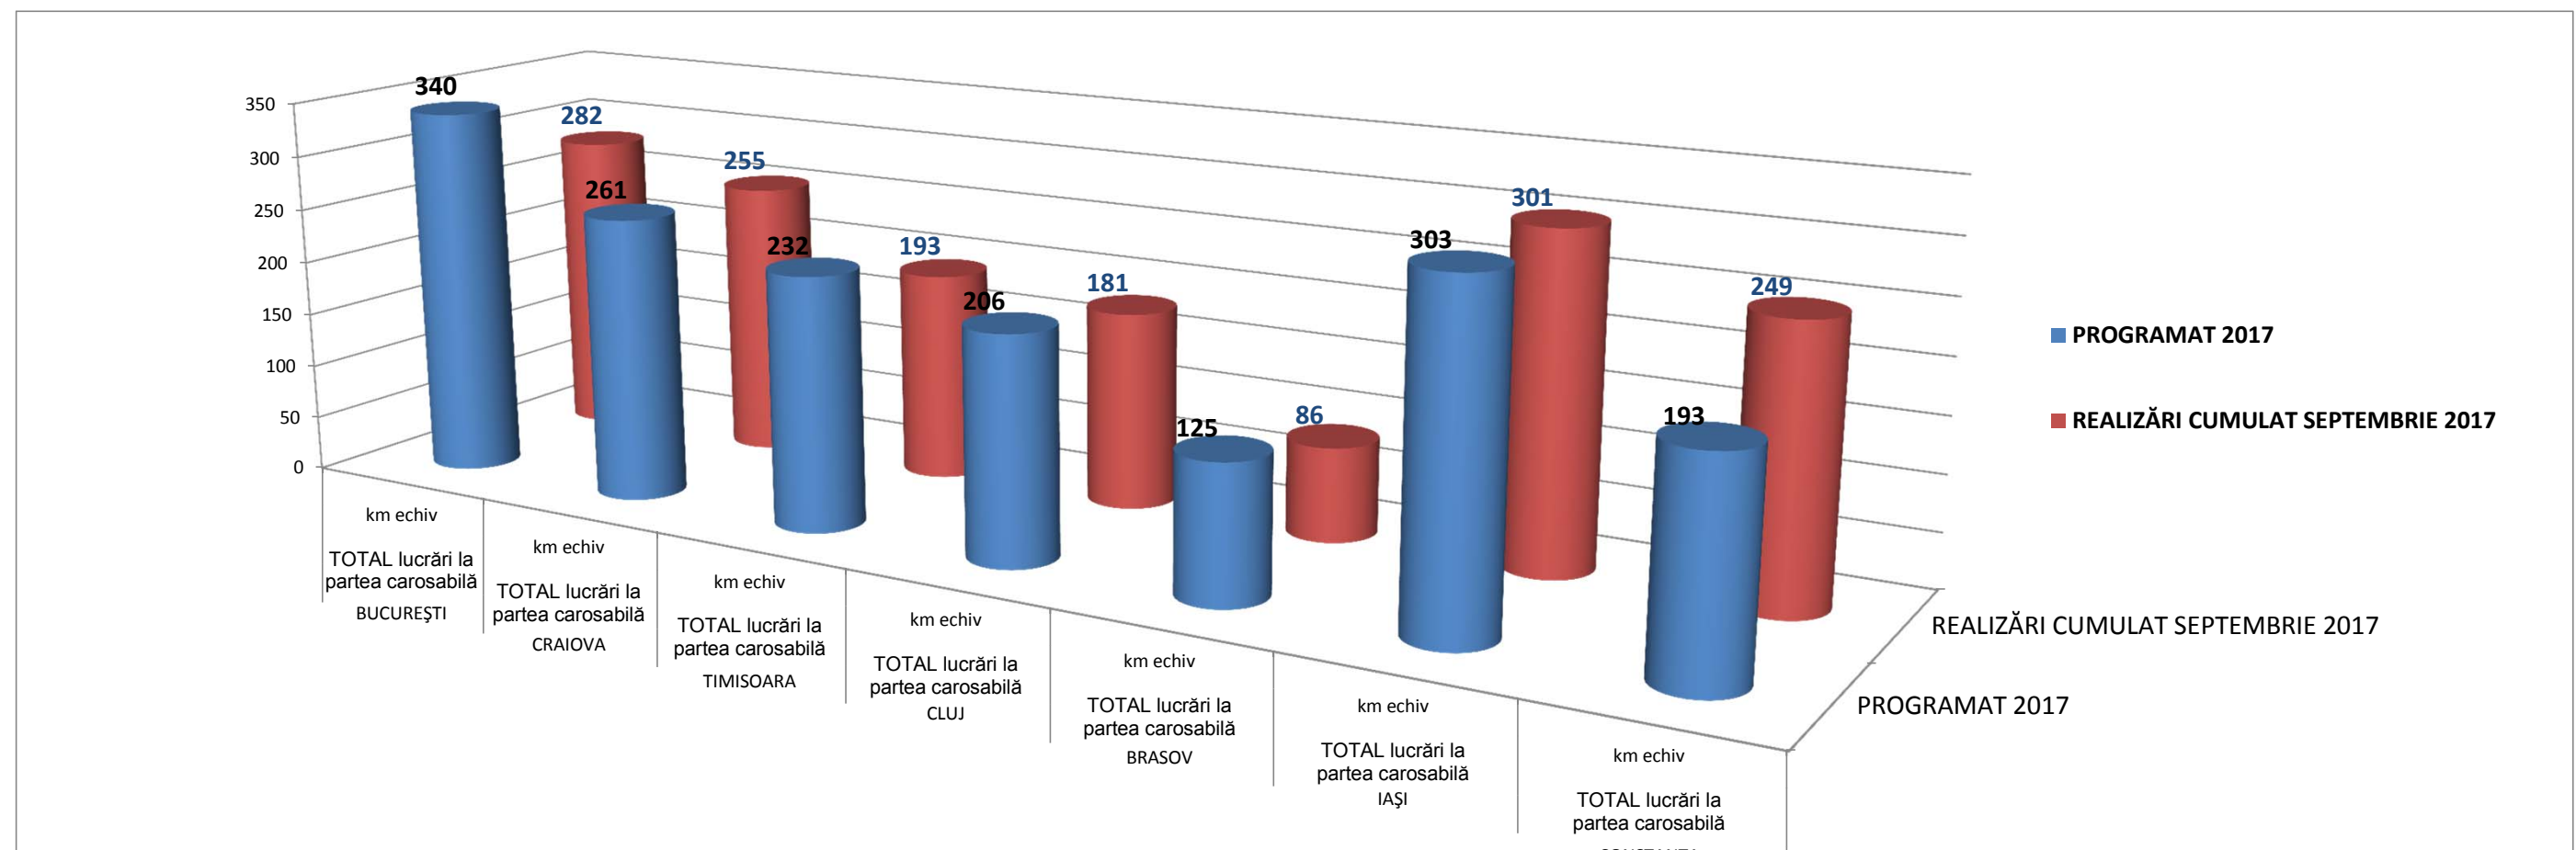


COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN ROMÂNIA

ANALIZA COMPARATIVĂ INTRE REALIZĂRILE 2016 ȘI REALIZĂRILE PRELIMINATE LA 9 LUNI (SEPTEMBRIE) 2017 CU PRIVIRE LA LUCRĂRILE DE INTREȚINERE PERIODICĂ


| D.R.D.P | TIPUL LUCRARILOR DE INTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE | UM | REALIZĂRI 2016 | PROGRAMAT 2017 | REALIZĂRI CUMULAT SEPTEMBRIE 2017 | % realizări km echivalenți |
|-------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| BUCUREȘTI | TOTAL D.R.D.P BUCUREȘTI | km echiv | 383,29 | 295,12 | 238,72 | 81% |
| CRAIOVA | TOTAL D.R.D.P CRAIOVA | km echiv | 47,64 | 215,58 | 183,389 | 85% |
| TIMISOARA | TOTAL D.R.D.P TIMIȘOARA | km echiv | 136,44 | 206,35 | 168,03 | 81% |
| CLUJ | TOTAL D.R.D.P CLUJ | km echiv | 229,82 | 159,398 | 104,221 | 65% |
| BRASOV | TOTAL D.R.D.P BRASOV | km echiv | 116,02 | 66,44 | 50,1 | 75% |
| IAȘI | TOTAL D.R.D.P IAȘI | km echiv | 250,79 | 260,35 | 230,1 | 88% |
| CONSTANTA | TOTAL D.R.D.P CONSTANȚA | km echiv | 129,24 | 177,56 | 137,61 | 78% |

NOTĂ : Totalul lucrărilor la partea carosabilă este format din
1.TRATAMENTE BITUMINOASE
2.STRATURI RUTIERE FOARTE SUBTIRI
3.COVOARE ASFALTICE


PROGRAMAT 2017

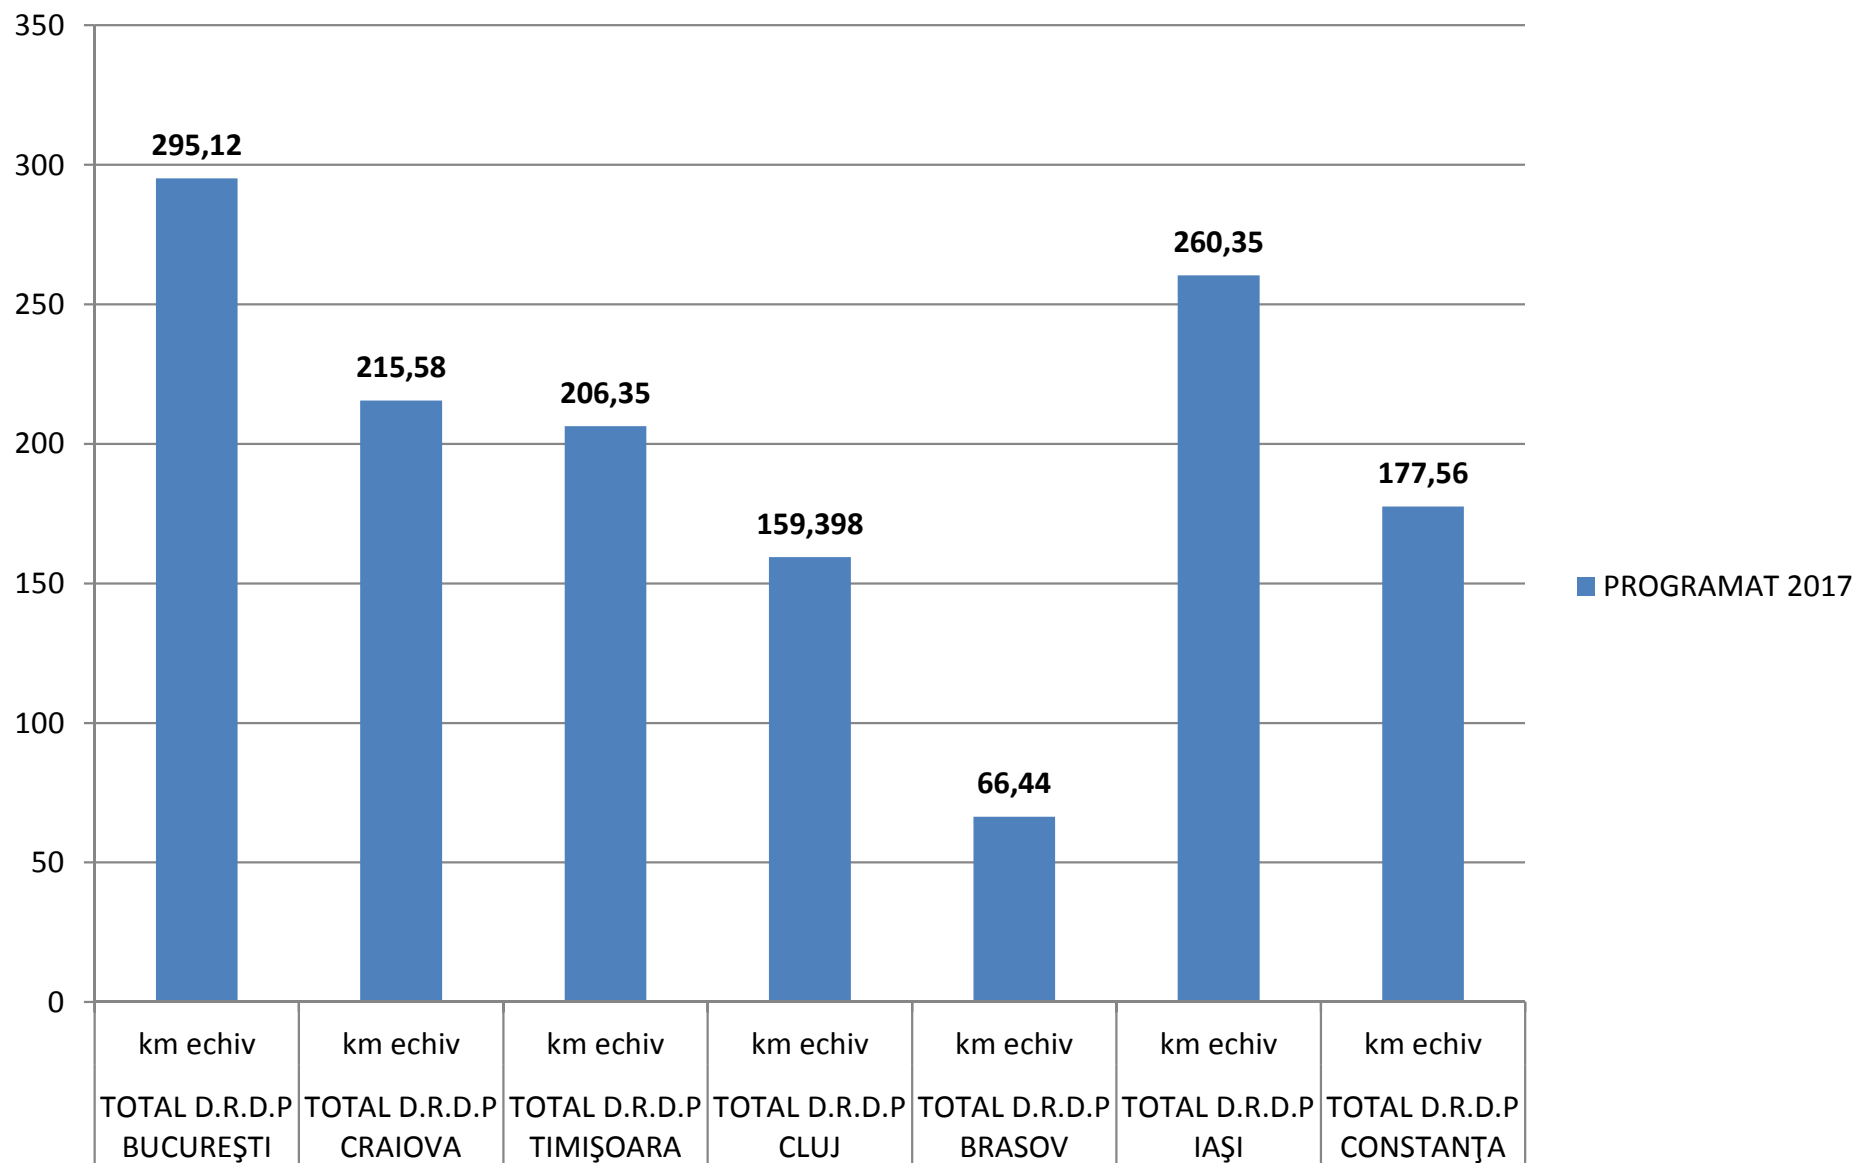



REALIZĂRI 2016

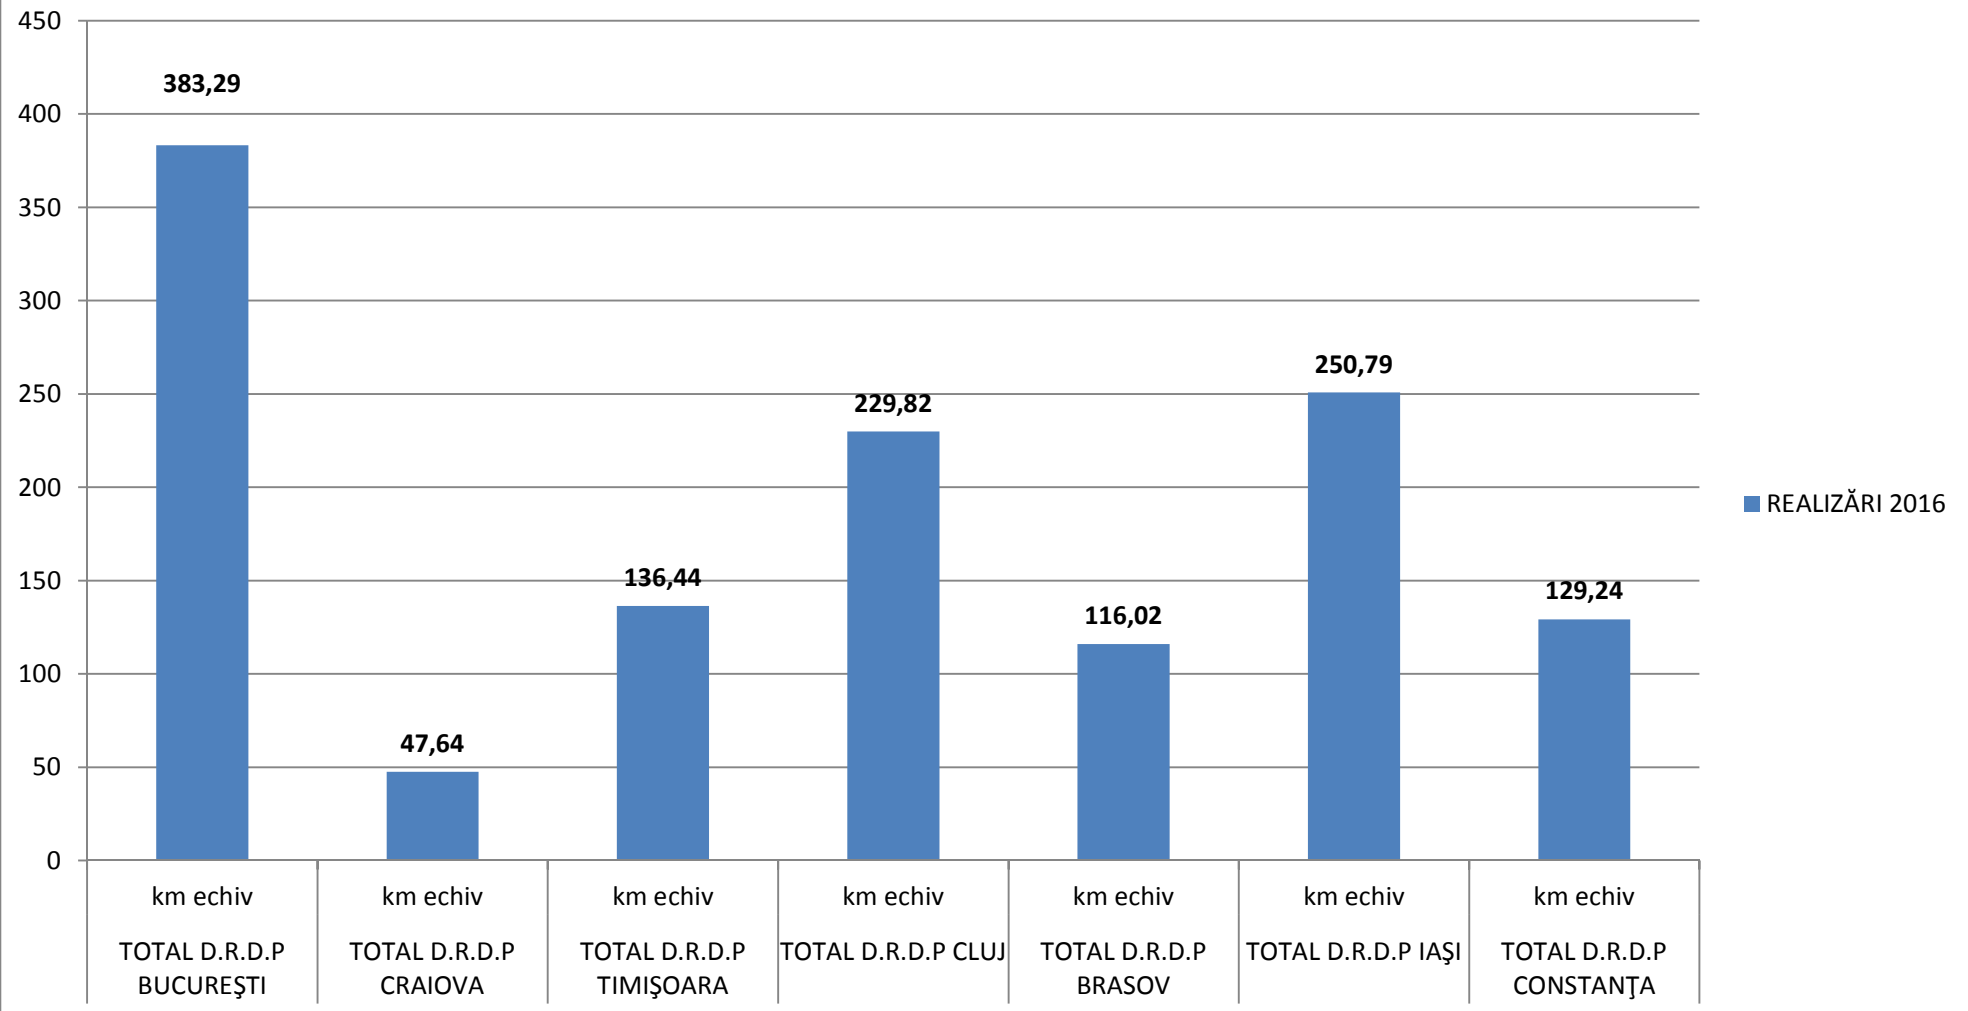

REALIZĂRI CUMULAT SEPTEMBRIE 2017

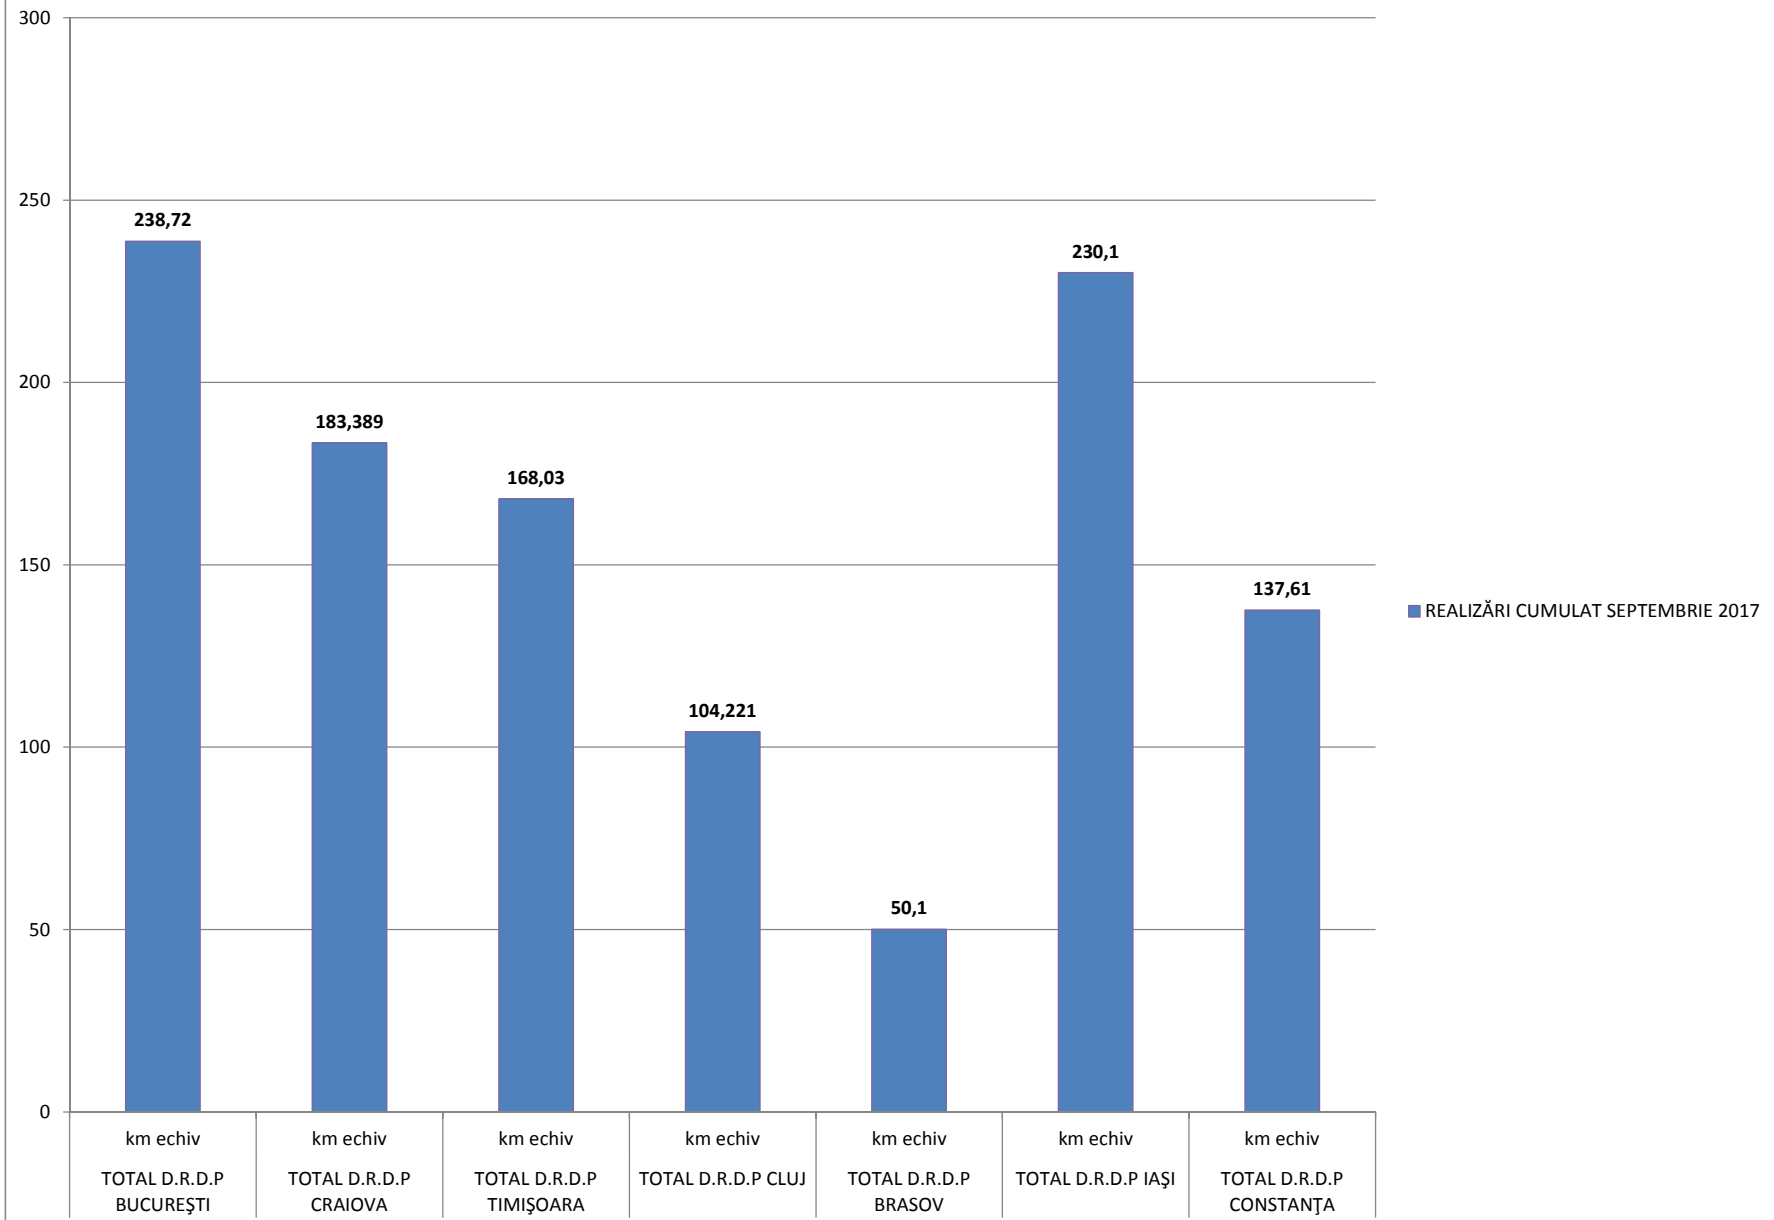

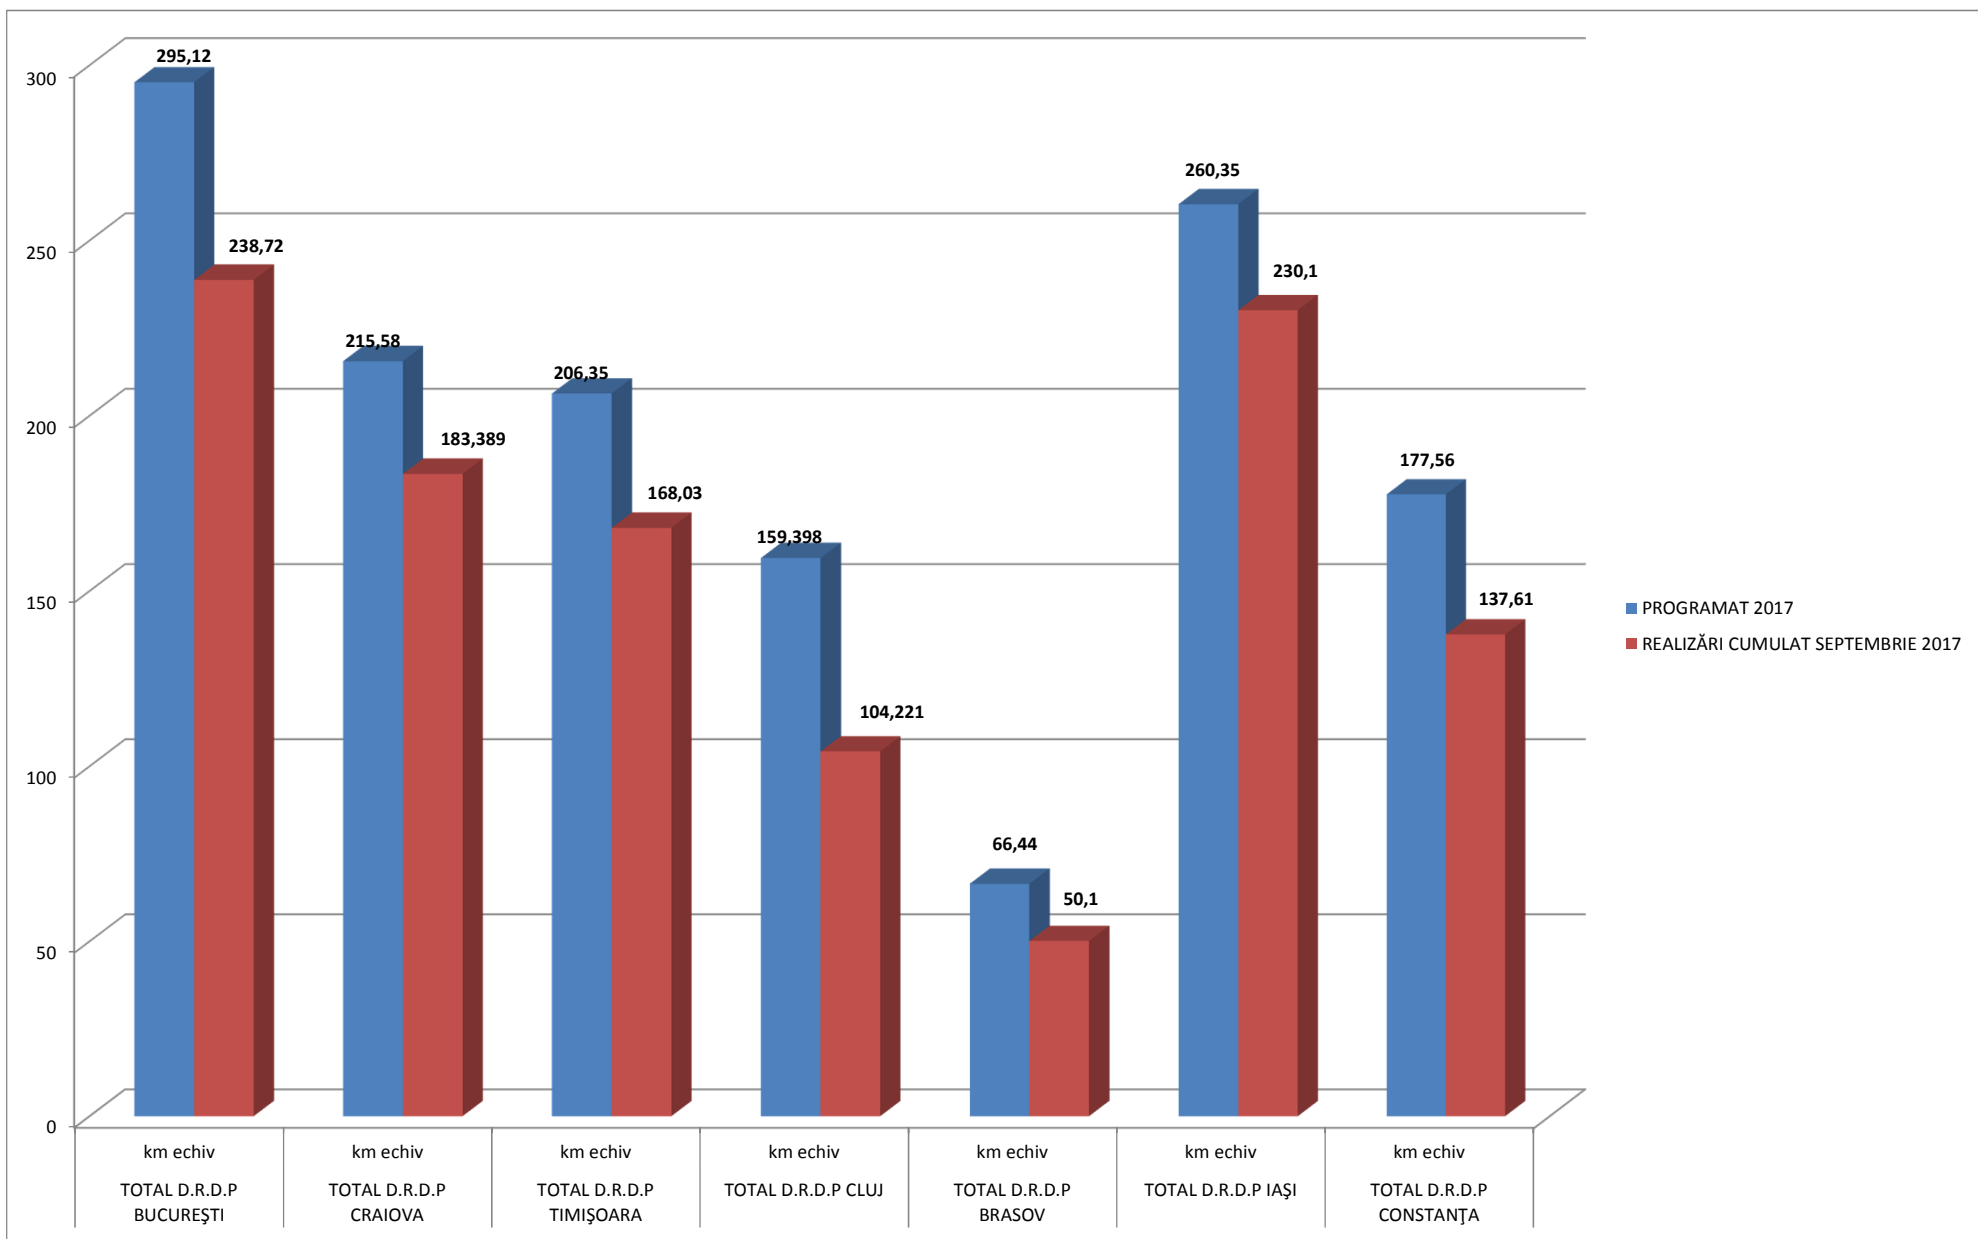

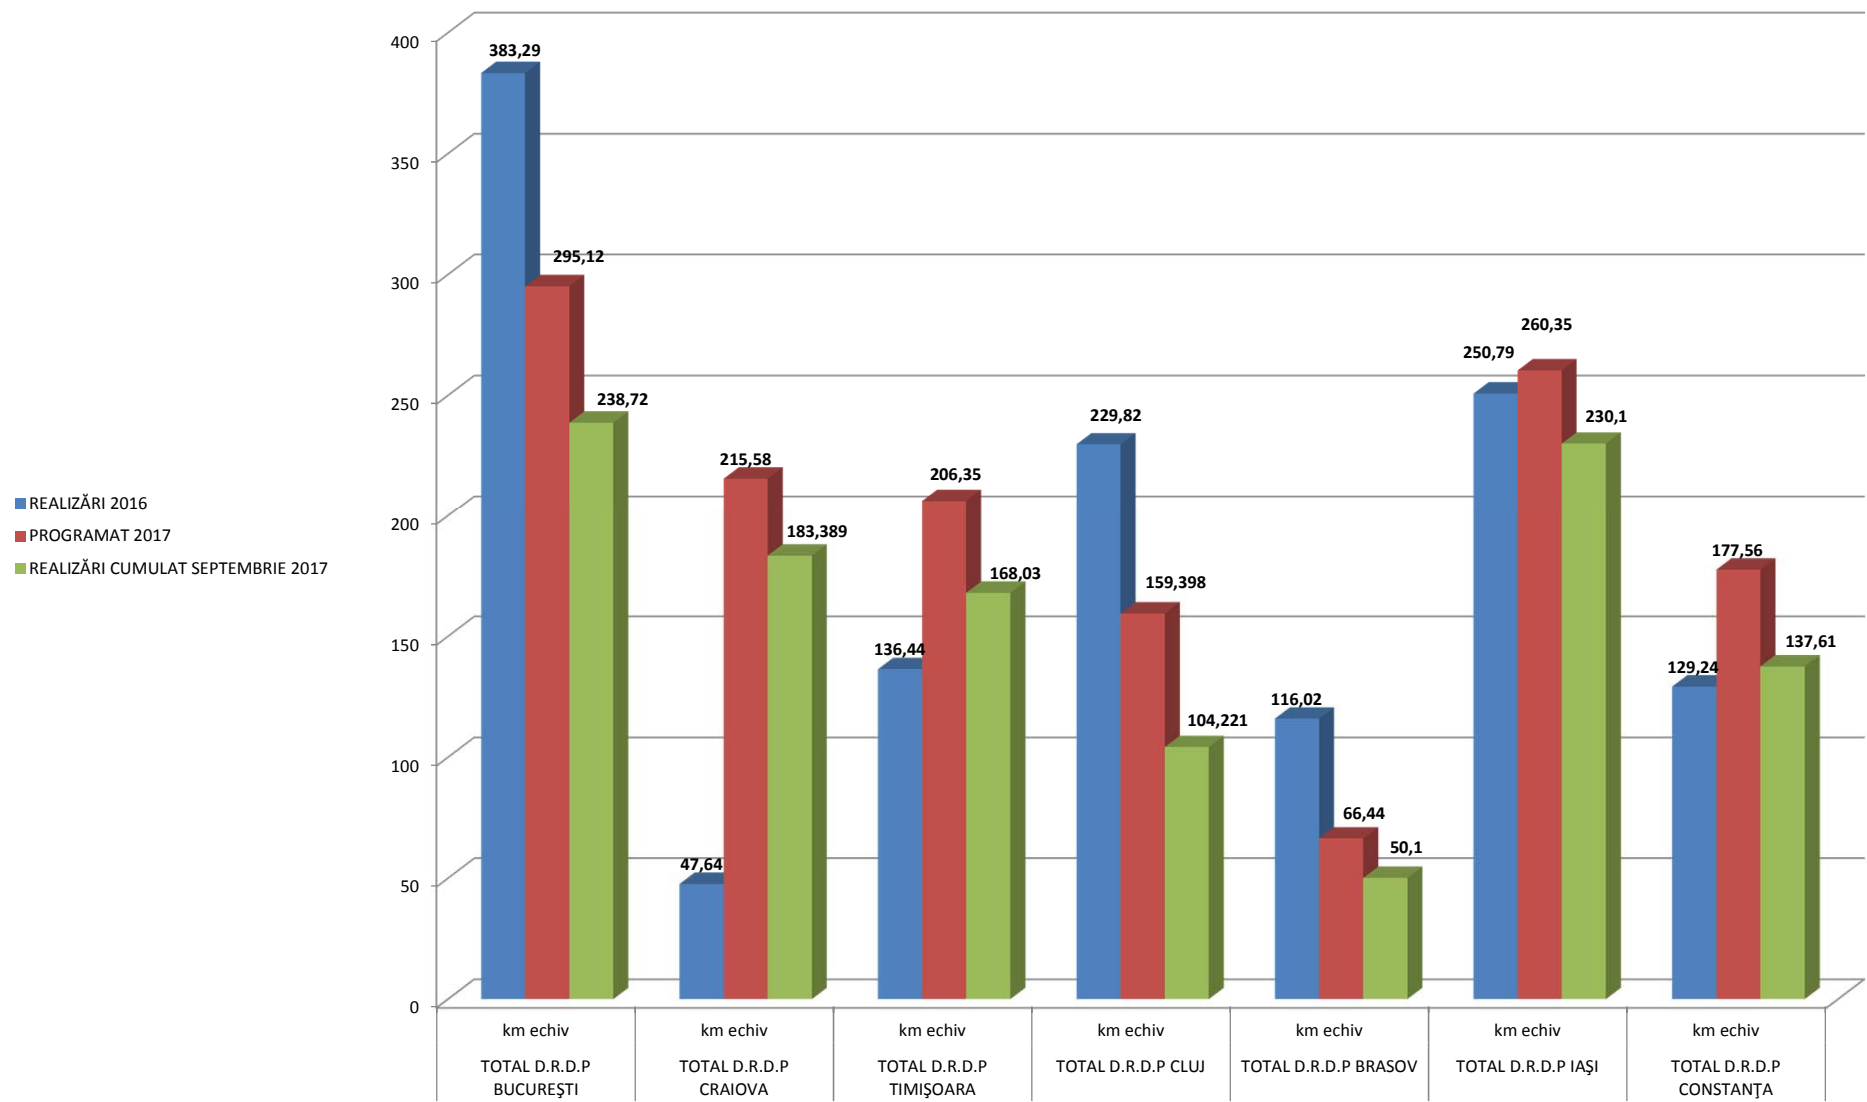

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN ROMÂNIA

INTRETINERE PERIODICĂ - COVOARE ASFALTICE PROGRAMATE SI EXECUTATE IN ANUL 2017

| D.R.D.P | TIPUL LUCRARILOR DE INTREȚINERE PERIODICĂ | UM | PROGRAMAT 2017 | REALIZĂRI CUMULAT SEPTEMBRIE 2017 | % realizări km echivalenți |
|-----------|---|----------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| BUCUREȘTI | COVOARE ASFALTICE | km echiv | 211,9 | 155,5 | 73% |
| CRAIOVA | COVOARE ASFALTICE | km echiv | 82,56 | 71,161 | 86% |
| TIMISOARA | COVOARE ASFALTICE | km echiv | 64,4 | 45,83 | 71% |
| CLUJ | COVOARE ASFALTICE | km echiv | 21,01 | 5,11 | 24% |
| BRASOV | COVOARE ASFALTICE | km echiv | 10,35 | 0 | 0% |
| IAȘI | COVOARE ASFALTICE | km echiv | 260,35 | 230,1 | 88% |
| CONSTANTA | COVOARE ASFALTICE | km echiv | 59,7 | 30,75 | 52% |

